Паспорт кабельной сборки

Жгут питания стойки, серийный номер **ПЗ-0001-0003**

Изделие

Изделие	**Жгут питания стойки**
Серийный номер	**ПЗ-0001-0003**
Задание	**ПЗ-0001**
Проект	**614К.1 / КБ1**
ЭТК и ревизия	**КБ1, ревизия 1**
Кабель	**RG-316, затухание 0,21 дБ/м**
Длина, м	**1,5**


Конец	Разъём	КСВ разъёма	Рабочая частота
А	SMA-J	≤ 1,25	до 6 ГГц
Б	SMA-J	≤ 1,3	до 6 ГГц

Норма

Норма	**КСВН не более 2,06**
Основание нормы	**ЭТК КБ1, ревизия 1**
Полоса нормы, МГц	**1 700 … 1 900**

КСВН по ВАЦ

Максимальный КСВН	**2,17 на частоте 1 816 МГц**
Полоса замера	**1 700 … 1 900 МГц, точек 201**
Попытка	**2 (всего 2)**
Файл замера	**kabel-3-povtor.s1p**
Результат	**Не годно**
Средство измерения	**Анализатор цепей Arinst VNA-DL, Векторный анализатор цепей, инв. № ИНВ-0143**
Поверка	**свидетельство № СП-2026/0418 от 07.09.2026, действительно до 07.09.2027**
Контролёр ОТК	**Артемий**
Дата и время проверки	**22.10.2026 17:16**

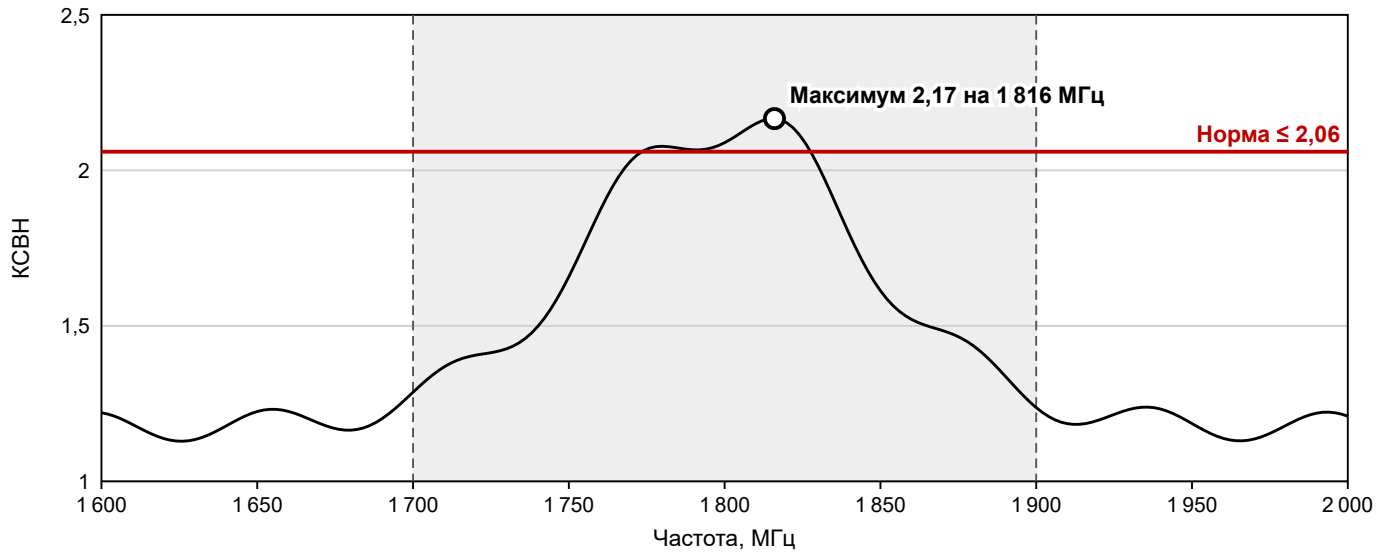

Заключение ОТК

Заключение	**Не годно**
Контролёр ОТК	**Артемий**
Дата	**22.10.2026 17:16**

Контролёр ОТК _____ / Артемий / Дата: _____
